ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	Předchůdci
1	**Hnojice - kanalizace a ČOV**	**263 dny**	**29.9. 14**	**30.9. 15**	
2	Termín předání staveniště	1 den	29.9. 14	29.9. 14	
3	Datum zahájení prací	1 den	30.9. 14	30.9. 14	2
4	**Přípravná fáze stavebního procesu**	**15 dny**	**1.10. 14**	**21.10. 14**	
5	Provedení doplňujících průzkumných prací	6 dny	1.10. 14	8.10. 14	3
6	Provedení zdokumentování stavebně technického stavu dotčených objektů, dotče	6 dny	1.10. 14	8.10. 14	5SS
7	Vytýčení všech stavbou dotčených inženýrských sítí (IS), ověření stávajících inže	6 dny	3.10. 14	10.10. 14	6SS+2 dny
8	Identifikace a pasportizace inženýrských sítí staveniště, ověření projektovaného s	6 dny	3.10. 14	10.10. 14	7SS
9	Vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným	9 dny	3.10. 14	15.10. 14	8SS
10	Označení staveniště v rozsahu dle zadávací dokumentace	2 dny	15.10. 14	16.10. 14	9FF+1 den
11	Zajištění a umístění informačního panelu, stálý velkoplošný informační panel	2 dny	15.10. 14	16.10. 14	10SS
12	Provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru	5 dny	15.10. 14	21.10. 14	11SS
13	**Realizační fáze stavebního procesu**	**245 dny**	**15.10. 14**	**22.9. 15**	
14	Vybudování zařízení staveniště v rozsahu dle zadávací dokumentace (včetně nap	5 dny	15.10. 14	21.10. 14	10SS
15	Zajištění bezpečného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po	5 dny	15.10. 14	21.10. 14	14SS
16	Zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem, přilehlých	9 dny	15.10. 14	27.10. 14	15SS
17	**Předpokládané období nepříznivých klimatických podmínek**	51 dny	22.12. 14	2.3. 15	
18	**Inženýrské objekty**	**235 dny**	**29.10. 14**	**22.9. 15**	
19	**SO 01.1 Kanalizace**	**191 dny**	**29.10. 14**	**22.7. 15**	
20	Stoka A km 0,162-0,563	55 dny	29.10. 14	25.3. 15	14SS+10 dny
21	Stoka A km 0,00-0,162	20 dny	26.3. 15	22.4. 15	20
22	Stoka A km 0,563-0,671	10 dny	23.4. 15	6.5. 15	21
23	Stoka A1 km 0,00-0,351	33 dny	7.5. 15	22.6. 15	22
24	Stoka A1 km 0,351-0,394	7 dny	23.6. 15	1.7. 15	23
25	Stoka A1.1	7 dny	2.7. 15	10.7. 15	24
26					
27	Stoka B	71 dny	12.11. 14	30.4. 15	
28	Stoka B1	5 dny	1.5. 15	7.5. 15	27
29	Stoka B2	3 dny	8.5. 15	12.5. 15	28
30	Stoka B3	4 dny	13.5. 15	18.5. 15	29
31	Stoka B4	9 dny	19.5. 15	29.5. 15	30
32	Stoka OS1	10 dny	1.6. 15	12.6. 15	31
33	Stoka A1.2	15 dny	15.6. 15	3.7. 15	32
34					
35	Stoka D.1	15 dny	5.11. 14	25.11. 14	
36	Stoka D - úsek D1 až D2	5 dny	26.11. 14	2.12. 14	35
37	Stoka D.1.1 úsek D1-1 až D1-2	5 dny	8.12. 14	12.12. 14	76
38	Stoka D.1.1	15 dny	2.3. 15	20.3. 15	
39	Stoka D	45 dny	23.3. 15	22.5. 15	38
40	Stoka D.A	10 dny	11.6. 15	24.6. 15	75
41	Stoka D.A1	5 dny	25.6. 15	1.7. 15	40
42					
43	Přeložka vodovodu - Stoka OS2	3 dny	24.11. 14	26.11. 14	
44	Stoka OS2	10 dny	27.11. 14	10.12. 14	43
45	Stoka C.1	10 dny	11.12. 14	5.3. 15	44
46	Stoka C.1.1	6 dny	6.3. 15	13.3. 15	45
47	Stoka C.1.1.1	4 dny	16.3. 15	19.3. 15	46
48	Stoka C km 0,00-0,078	10 dny	20.3. 15	2.4. 15	47
49	Stoka C km 0,078-0,426	41 dny	3.4. 15	29.5. 15	48
50	Stoka C.3	10 dny	1.6. 15	12.6. 15	49
51	Stoka C.2	5 dny	15.6. 15	19.6. 15	50
52	Stoka A2	17 dny	22.6. 15	14.7. 15	51
53	Stoka A2.1	6 dny	15.7. 15	22.7. 15	52
54					
55					
56	**SO 01.2 Čerpací stanice**	**73 dny**	**1.4. 15**	**10.7. 15**	
57	Čerpací stanice ČS1	21 dny	1.4. 15	29.4. 15	
58	Čerpací stanice ČS2	21 dny	30.4. 15	28.5. 15	57
59	Čerpací stanice ČS3	21 dny	29.5. 15	26.6. 15	58
60	Čerpací stanice ČS4	10 dny	29.6. 15	10.7. 15	59
61	**SO 01.3 Přípojky NN a přívody NN k čerpacím stanicím**	**62 dny**	**30.4. 15**	**24.7. 15**	
62	Přípojka NN k ČS1	10 dny	30.4. 15	13.5. 15	57
63	Přípojka NN k ČS2	10 dny	29.5. 15	11.6. 15	58
64	Přípojka NN k ČS3	10 dny	29.6. 15	10.7. 15	59
65	Přípojka NN k ČS4	10 dny	13.7. 15	24.7. 15	60
66	**SO 01.4 Výtlaky z čerpacích stanic**	**68 dny**	**23.3. 15**	**24.6. 15**	
67	Výtlak V-B	6 dny	30.4. 15	7.5. 15	57
68	Výtlak V-C	6 dny	29.5. 15	5.6. 15	58
69	Výtlak V-D	45 dny	23.3. 15	22.5. 15	39SS
70	Výtlak V-DA	10 dny	11.6. 15	24.6. 15	40SS
71	**SO 01.5 Odbočky k domovním přípojkám**	120 dny	2.3. 15	14.8. 15	
72	**SO 01.6 Opravy krajských komunikací po výkopech**	60 dny	1.7. 15	22.9. 15	
73	**SO 01.7 Opravy místních komunikací po výkopech**	60 dny	1.7. 15	22.9. 15	
74	**SO 01.8 Přeložky dešťové kanalizace**	**136 dny**	**3.12. 14**	**10.6. 15**	
75	Přeložka dešťové kanalizace DK1	13 dny	25.5. 15	10.6. 15	39
76	Přeložka dešťové kanalizace DK2	3 dny	3.12. 14	5.12. 14	36
77	**Stavební objekty - Čistírna odpadních vod**	146 dny	5.11. 14	27.5. 15	
78	**Provozní soubor**	**147 dny**	**15.1. 15**	**7.8. 15**	
79	**PS 01 Čerpací stanice - technologie**	**62 dny**	**14.5. 15**	**7.8. 15**	
80	Čerpací stanice ČS1	10 dny	14.5. 15	27.5. 15	62
81	Čerpací stanice ČS2	10 dny	12.6. 15	25.6. 15	63
82	Čerpací stanice ČS3	10 dny	13.7. 15	24.7. 15	64
83	Čerpací stanice ČS4	10 dny	27.7. 15	7.8. 15	65
84	**PS 02 Čerpací stanice - elektrotechnologie**	**62 dny**	**14.5. 15**	**7.8. 15**	
85	Čerpací stanice ČS1	10 dny	14.5. 15	27.5. 15	80SS
86	Čerpací stanice ČS2	10 dny	12.6. 15	25.6. 15	81SS
87	Čerpací stanice ČS3	10 dny	13.7. 15	24.7. 15	82SS
88	Čerpací stanice ČS4	10 dny	27.7. 15	7.8. 15	83SS
89	PS 03 ČOV	95 dny	15.1. 15	27.5. 15	77FF
90	**Datum ukončení prací - Termín předání a převzetí díla - Řádné protokolární před**	1 den	30.9. 15	30.9. 15	

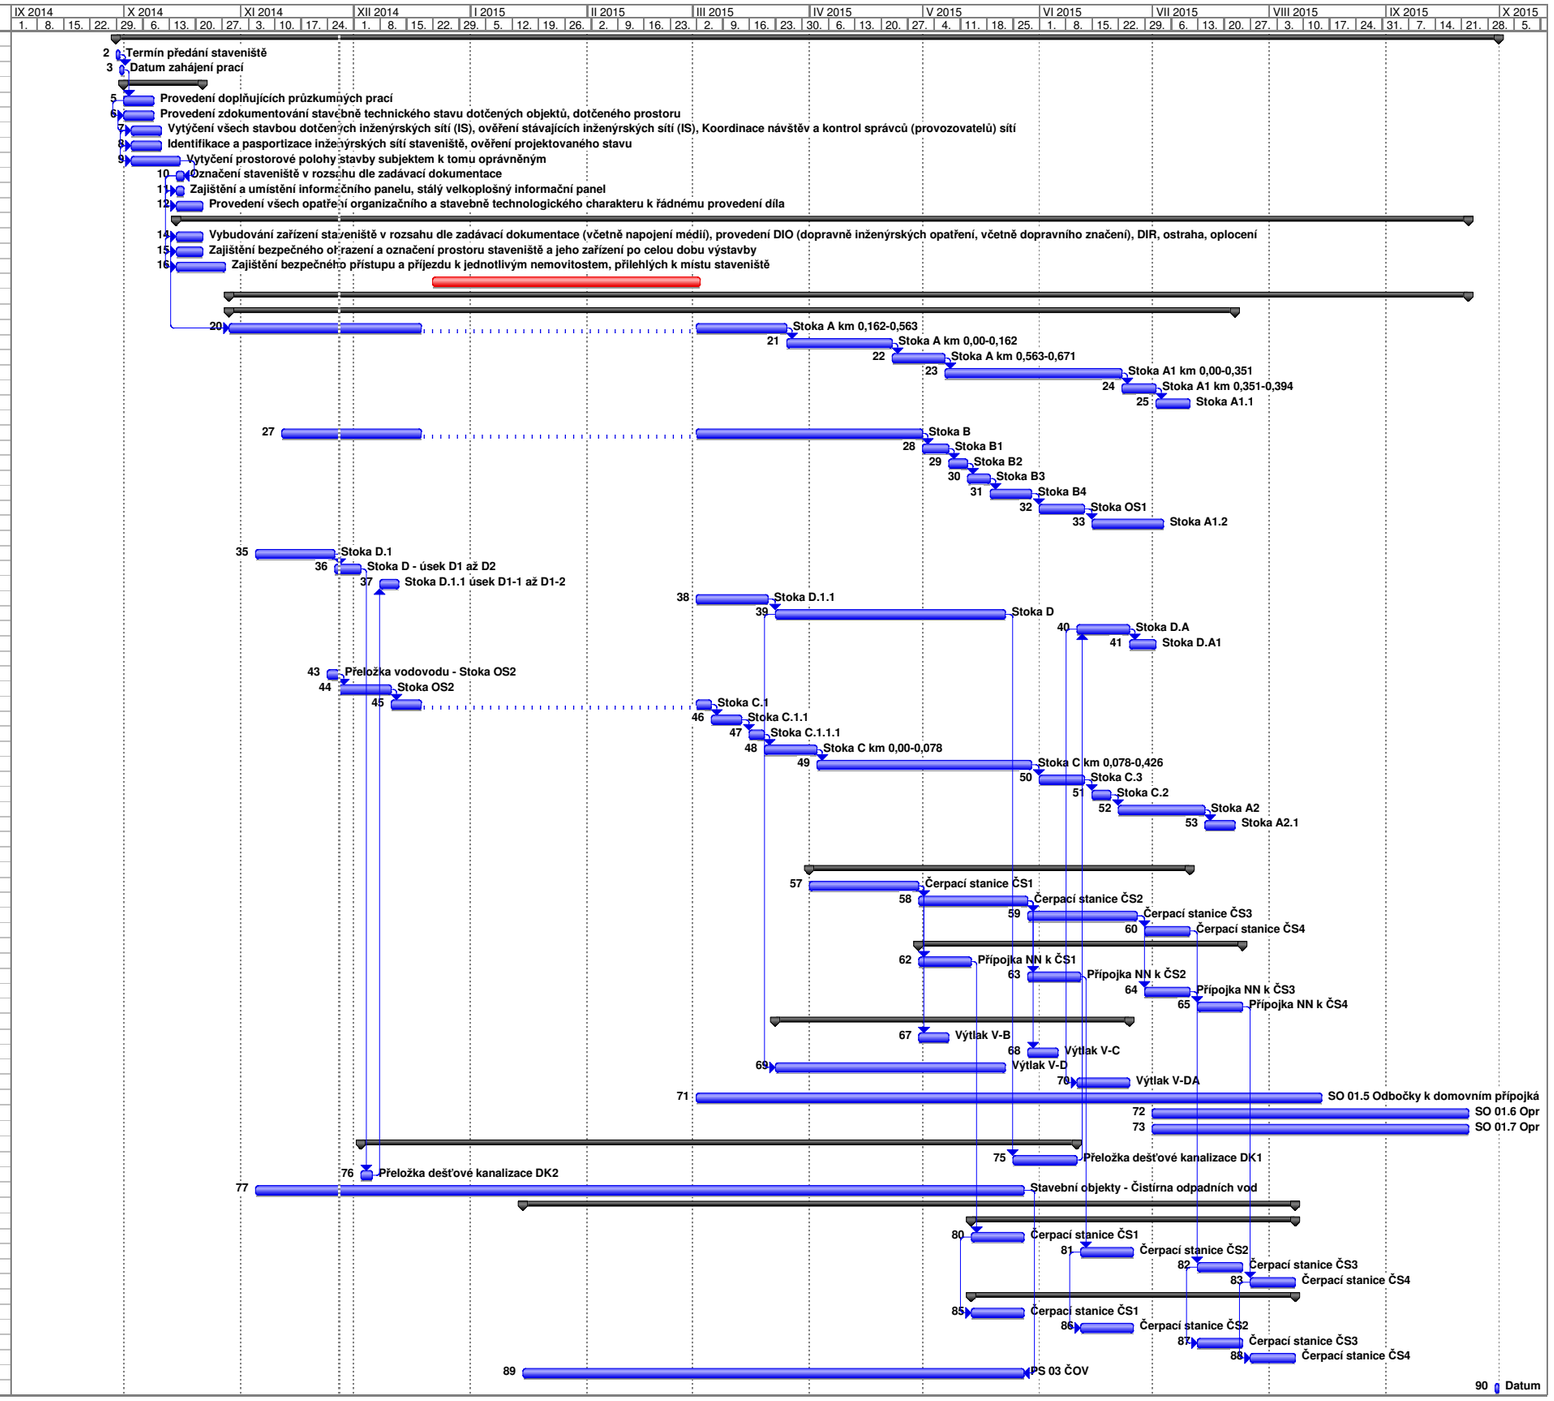

Projekt: Časový harmonogram prací_v
Datum: 27.11. 14

Úkol | Rozdělení | Průběh | Milník | Souhrnný | Souhrn projektu | Vnější úkoly | Vnější milník | Konečný termín
